




Verslag VTC 22 augustus 2013

- 1 Workshop 1
- 2 Workshop 2
- 3 Classroom 1
- 4 Classroom 2
- 5 Classroom 3
- 6 Classroom 4
- 7 Sanitary Girls
- 8 Boarding Girls 1
- 9 Boarding Girls 2
- 10 Computerroom
- 11 Library 1
- 12 Library 2
- 13 Administration 1
- 14 Administration 2
- 15 Administration 3
- 16 Sanitary Boys
- 17 Boarding Boys 1
- 18 Boarding Boys 2
- 19 Practical 1
- 20 Practical 2
- 21 Practical 3
- 22 Carpentry Workshop
- 23 Auto mechanics Workshop
- 24 Insaka
- 25 Kitchen and restaurant

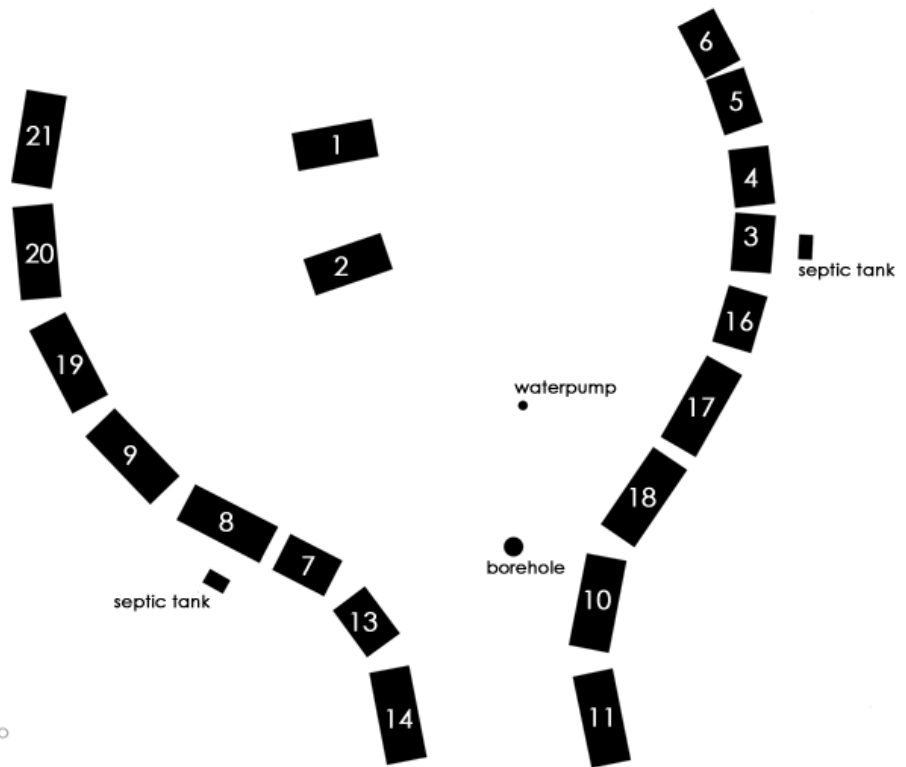

Beste GKMT,

Onderstaand het verslag van de afgelopen maand.

Classroom 4. Vensters en deuren voorzien van aftimmering en dorpels (↓). Kabelgoot gedeeltelijk klaar (↓).



Classroom 3. Vensters en deuren voorzien van aftimmering en dorpels.

Classroom 2. Vensters en deuren voorzien van aftimmering en dorpels (↓). Kabelgoot klaar (↓).



Sanitary Boys. Afwerkvloer gestort (↓).



Boarding Boys 1. Afwerkvloeren gestort aan rechterzijde, nu hele gebouw af(↑). Binnendeuren gemaakt (4 van de 8 af).

Boarding Boys 2. Muurplaat aangebracht, wanden gepleisterd, spanten geplaatst en veranda overstek gemonteerd (↓).



Library 1. Dak af en begonnen met de gevelbekleding (↑).

Administration 1. Dak aan achterzijde af en voorzijde halverwege (↓).



Practical 2. Deuren gemaakt, afgehangen en voorzien van sloten (↓). De grote voorraad Musase is verplaatst van de workshop 1 naar dit gebouw om ruimte te maken voor de machines en de generator uit de container (↓), verderop meer.



Veranda. Aan de jongens vleugel is de veranda aan de voorzijde klaar voor wat betreft het vullen met gravel, het pleisteren, vlechten en leggen van wapeningsnetten en bekisten (↓), en voor twee derde is de vloer gestort (↓). Aan de achterzijde is de veranda gevuld met gravel en gepleisterd (↓).



Stagiaires Tubombeshe. In samenspraak met leraren van de timmeropleiding Tubombeshe hebben we besloten om zes stagiaires aan te nemen voor een periode van drie maanden. Vijf jongens en een meisje. Ik heb ons team van timmermannen opgedeeld in vijf groepen die zich de komende tijd bezig gaan houden met een specifiek onderdeel van de bouw te weten; 1) Maken en plaatsen van spanten onder leiding van Mr. Tellas, 2) Gevelbekleding onder leiding van Elijah en Hullet, 3) Binnendeuren vervaardigen onder leiding van Morgan, 4) Kabelgoten maken onder leiding van Mishi en 5) Aftimmering ramen en deuren onder leiding van Benson (↓). De studenten zullen iedere week rouleren zodat ze aan het eind van de stageperiode aan alle onderdelen meerdere malen hebben deelgenomen. De studenten overnachten in de boarding Boys die af is met twee op een kamer en het meisje apart met een deur die op slot kan. We betalen ze iedere week KR 50 p/p voor eten en KR20 p/p voor vervoer terug naar Ibenga in het weekend. Wasgelegenheid is gemaakt aan de achterzijde van de boarding met oud hout nog over uit de tijd van Thijs (↓).



Boven(vlnr): Tellas, Benson, Ockshet, Mishi, Hullet, Morgan, Elijah (VTC'ers)
Onder (vlnr): Erof, Jesper, Clearance, Mabel, Jackson, Greenwell, Abraham (Stagiaires op Jesper na)

Container. De container is Woensdag 7 augustus aangekomen en in zijn geheel van de vrachtwagen geladen. Deze is dezelfde dag aan het begin van de middag al terug gegaan naar Tanzania. We hebben, nadat we de generator tijdelijk op onze eigen truck hebben gezet, alle pc's, fietsen en de losse dozen en zakken opgeslagen in een van de klaslokalen. De meeste zware machines zijn in de container gebleven en de generator is er aan het eind van de dag ook in terug gezet. Zodra de machines geplaatst en geïnstalleerd kunnen worden zullen we een vorkheftruck moeten huren om de container helemaal leeg te kunnen halen (↓).



Inmiddels zijn de fietsen in elkaar gezet. We hebben wat binnenbanden, moeren, bouten en een zadelstang moeten bijkopen en een voorvork provisorisch moeten rechtbuigen, maar hebben nu zes complete fietsen. Een is naar Pious gegaan en een naar de VTC. De overige vier krijgen later een bestemming.

De kleinere machines staan tijdelijk opgeslagen in ons magazijn (↓) maar gaan binnenkort naar de leeggehaalde workshop 1 (↓). De bedoeling is om enkel de machines die we nu al goed kunnen gebruiken aan te sluiten op de grote generator en tijdelijk te installeren in de workshop.


Op alle pc's is windows geïnstalleerd. Ze werken prima. Vier staan in het internetcafé, een bij Pious, een bij Shanda, drie op het GCMF kantoor voor met name Joe en Elias en een op de plot voor Mr. Kafuwa en zijn nieuwe magazijn assistent Juvenalis Kalima (↓). Zij houden de inkomende en ugaande materialen bij. Met Excel werken heb ik ze een maand geleden geleerd en gaat nu al verbazingwekkend snel (↓).



Alle mannen op de VTC hebben een werkbroek en een shirt ontvangen. Het was even puzzelen met de maten, maar iedereen heeft een volledig (iets te groot) outfit gekregen die overigens eigendom blijft van de VTC.

Bouwvergunning. De werktekeningen zijn in bezit van de planningsoffice in Ndola, maar zijn voornamelijk van feedback noch commentaar voorzien. Het blijft dus wachten op zowel de vergunning als het plotnummer.

Tekenwerk. In opdracht van Stijn een Poultry uitgetekend voor Tubombeshe. Begroting wordt door Stijn gemaakt en volgt later(↓).

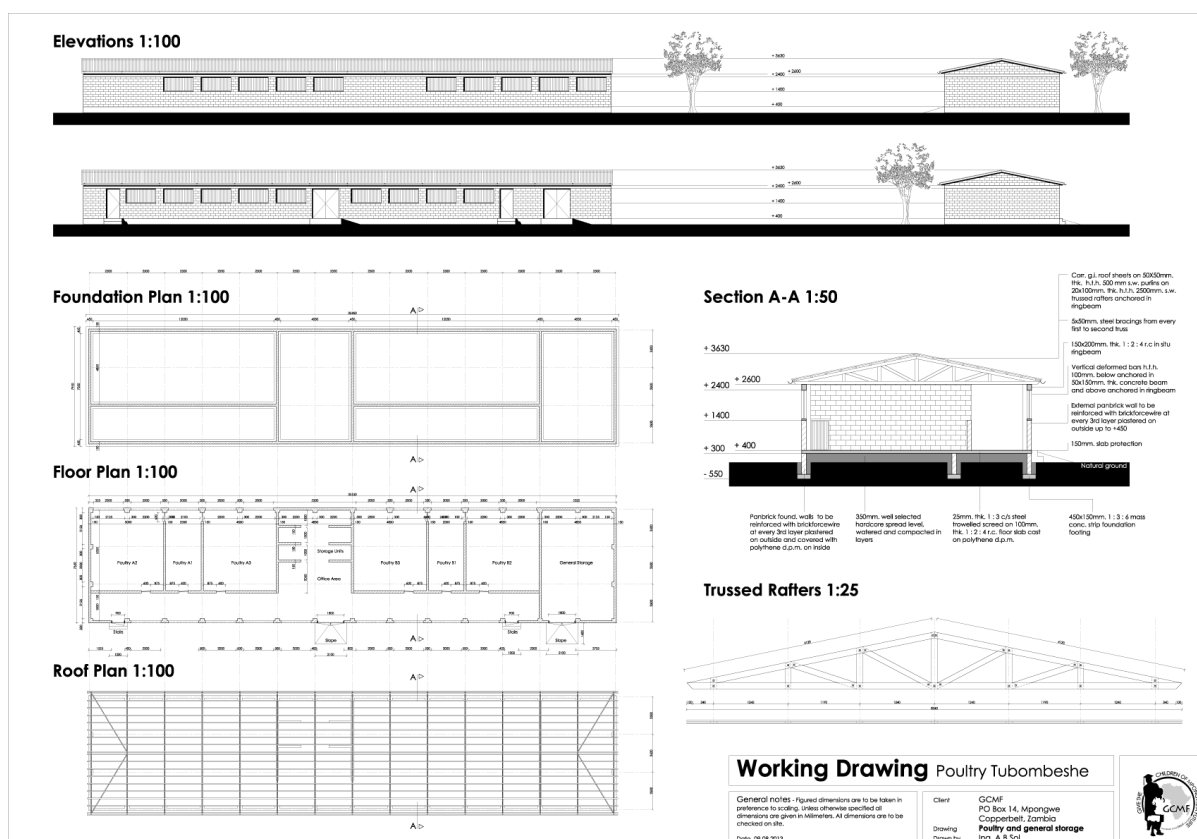

Personeel. De dakdekkers hebben aangegeven niet langer voor Gillen (de onderaannemer) te willen werken. Dit in verband met uitbetalingen en de geringe aanwezigheid van Gillen zelf op de bouwplaats. Bovendien stond het hen tegen dat Gillen een aanzienlijk deel van de verdiensten voor zichzelf houdt zonder hier daadwerkelijk iets voor te doen. Al meerdere keren kwam het voor dat de dakdekkers werk weigerden gedurende enkele dagen als er even daarvoor onenigheid was geweest. Ze zijn bij me komen vragen of ze wellicht direct voor de VTC konden komen werken. Omdat er geen contract bestond tussen Gillen en ons en het voor ons zowel goedkoper alsook beter te controleren wordt hebben we besloten de wensen van de dakdekkers in te willigen. Natuurlijk wel in samenspraak met Gillen zelf die een laatste poging heeft ondernomen om te lijmen, maar dat mocht niet meer baten. De vijf dakdekkers komen vanaf het volgende dak bij ons in het team. Ze zijn akkoord gegaan met onze voorwaarden wat betreft salarissen en overig beleid en gaan in de periode dat er geen gras voorhanden is andere werkzaamheden verrichten.

Ik heb voor alle werknemers van de VTC een bankrekening geopend bij de Natsafe Bank die vorige maand is geopend in Mpongwe. Vanaf nu worden alle salarissen gestort op de verschillende rekeningen. Feitelijk neemt Natsafe zo werk uit mijn handen, omdat ik enkel een totaalbedrag en een lijst met de namen en bedragen kan afgeven en zij de verdere verdeling doen. Geen gezocht meer naar kleine briefjes en muntjes en een mooie gelegenheid om de mannen te leren sparen. Ze kunnen niet meer met het contante geld rechtstreeks naar de kroeg op payday.

Vriendelijke groeten, Bram
